

**รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔**

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ได้จัดทำรายงานสรุปและวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) ที่ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุต่าง ๆ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อแสดงให้เห็นว่าในรอบปีที่ผ่านมา มีผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างเป็นอย่างไร เพื่อให้เป็นไปตามกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ที่กำหนดให้ส่วนราชการนำผลการวิเคราะห์ไปปรับปรุงและพัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในภาพรวม

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณปี ๒๕๖๔ และเงินสนับสนุนจากกองทุนเพื่อการพัฒนาการตรวจเงินแผ่นดิน งบลงทุนในหมวดค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง จำนวนเงินรวม ๔๘๓,๓๒๑,๓๐๐.๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว เป็นเงิน ๕๖,๖๘๒,๖๘๑.๔๔ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๗๓ โดยอยู่ระหว่างดำเนินการ เป็นเงิน ๔๒๕,๖๒๘,๒๐๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๐๖ ยังไม่ได้ดำเนินการ เป็นเงิน ๓๕๒,๙๐๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๗ คงเหลือ ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๖๕๗,๕๑๘.๕๖ บาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๑๔ (ภาพที่ ๒ : แผนภูมิสรุปรายงานการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างในภาพรวม (ค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔)

๒. จำนวนโครงการ/รายการ และจำนวนเงินที่เบิกจ่ายจริงแยกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จและเบิกจ่ายในปี ๒๕๖๔ จำนวน ๓๘๙ รายการ เป็นเงิน ๕๖,๖๘๒,๖๘๑.๔๔ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๗๓ ของเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ ๑

ตารางที่ ๑ สรุปการจัดซื้อจัดจ้างที่ส่งมอบและเบิกจ่ายแล้วในประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

จัดทำโดยวิธี	จำนวน		จำนวนเงินเบิกจ่าย	
	รายการ	ร้อยละ	บาท	ร้อยละ
เฉพาะเจาะจง	๓๖๓	๘๘.๑๑	๑๑,๙๒๙,๕๒๒.๖๖	๒.๔๗
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์	๒๖	๖.๓๑	๔๔,๗๕๓,๑๕๘.๗๘	๙.๒๖
รวม	๓๘๙	๙๔.๔๒	๕๖,๖๘๒,๖๘๑.๔๔	๑๑.๗๓
อยู่ระหว่างดำเนินการ	๑๓	๓.๑๕	๔๒๕,๖๒๘,๒๐๐.๐๐	๘๘.๐๖
ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑๐	๒.๔๓	๓๕๒,๙๐๐.๐๐	๐.๐๗
เงินคงเหลือ	-	-	๖๕๗,๕๑๘.๕๖	๐.๑๔
รวมทั้งสิ้น	๔๑๒	๑๐๐	๔๘๓,๓๒๑,๓๐๐.๐๐	๑๐๐

จากตารางข้างต้น จะพบว่า

๑) วิธีการที่ใช้ในการดำเนินงานมากที่สุด คือ วิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๓๖๓ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๑๑ รองลงมา คือ วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๒๖ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๖.๓๑ (ภาพที่ ๓ : แผนภูมิแสดงร้อยละของจำนวนรายการหรือโครงการที่จัดซื้อจัดจ้าง จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔)

๒) เงินงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างมากที่สุด คือ วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เป็นจำนวนเงิน ๔๔,๗๕๓,๑๕๘.๗๘ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙.๒๖ ของเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร รองลงมาคือ วิธีเฉพาะเจาะจง เป็นจำนวนเงิน ๑๑,๙๒๙,๕๒๒.๖๖ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒.๔๗ ของเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (ภาพที่ ๔: แผนภูมิแสดงร้อยละของจำนวนงบประมาณที่จัดซื้อจัดจ้าง จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔)

๓. การวิเคราะห์ความเสี่ยง

จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงในส่วนของการจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธี ได้แก่ วิธีเฉพาะเจาะจง วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยพิจารณาจากความเสี่ยงด้านต่าง ๆ ๕ ด้าน ได้แก่ ด้านโครงสร้าง ระบบงาน บุคลากร ทรัพย์สิน และงบประมาณ พบว่า

ด้านบุคลากรเป็นด้านที่มีความเสี่ยงในการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง แต่เป็นความเสี่ยงที่สามารถควบคุมได้

ด้านโครงสร้าง ระบบงาน ทรัพย์สิน และงบประมาณ ไม่มีความเสี่ยง เนื่องจากเหตุปัจจัย ดังนี้

- ๑) ด้านโครงสร้าง มีการมอบหมายงานที่ชัดเจน เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีครบตามโครงสร้าง
- ๒) ด้านระบบงาน การบริหารจัดการมีความชัดเจน มีเอกสารหลักฐานในการปฏิบัติงาน ทุกขั้นตอนทั้งเอกสารที่เป็นกระดาษ และข้อมูลที่บันทึกผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
- ๓) ด้านบุคลากร มีการกำหนดมอบหมายหน้าที่ให้ผู้ปฏิบัติงาน อีกทั้งหัวหน้างานได้มีการให้ความรู้ คำแนะนำในเบื้องต้นเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน และมีการติดตามงานของเจ้าหน้าที่อยู่ตลอดเวลา
- ๔) ด้านทรัพย์สิน มีเครื่องมือเครื่องใช้ อาทิเช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ ระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ เพียงพอต่อการใช้งานของผู้ปฏิบัติงาน
- ๕) ด้านงบประมาณ ส่วนใหญ่ได้รับการจัดสรรครบถ้วน

๔. ปัญหาอุปสรรคหรือข้อจำกัด

ปัญหาอุปสรรคหรือข้อจำกัดที่ส่งผลกระทบให้การดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินมีความล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างที่วางไว้ มีดังนี้

ปัจจัยภายนอก

๑. การก่อสร้างอาคารที่ทำการและอาคารชุดพักอาศัยของสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครนายก ผู้รับจ้างมีพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นว่าไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดได้
๒. การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามสัญญาและตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง เนื่องจากรัฐบาลประกาศ ล็อกดาวน์จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงาน

๓. การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงสถานที่และรายการก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักตรวจเงินแผ่นดิน จังหวัดสตูล พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบต้องได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีก่อน ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินการ

การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

๑. เมื่อได้รับจัดสรรเงินงบประมาณ (เพิ่มเติม) เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบไม่จัดทำรายงานแผนปฏิบัติการ จัดซื้อจัดจ้าง
๒. การจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องทำลายเอกสารแบบตัดละเอียด ของ สตภ. ๑๓ เมื่อได้รับงบประมาณแล้ว ไม่ดำเนินการทันที ทำให้ราคาครุภัณฑ์สูงกว่างบประมาณที่ได้รับจัดสรร

๓. ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพะเยา มีการยกเลิกประกาศประกวดราคา ๒ ครั้ง คือ ครั้งที่ ๑ เนื่องจากเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบแนบไฟล์เอกสารราคากลางฯ บางส่วนไม่ครบถ้วน ซึ่งเป็นส่วนที่เป็นสาระสำคัญ และครั้งที่ ๒ แบบรูปรายการที่ใช้ประกอบ e-bidding มีความคลาดเคลื่อน

๕. แนวทางการปรับปรุงแก้ไข และข้อเสนอแนะ

๑. ให้ความสำคัญกับการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง และกำหนดระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้าง ให้สอดคล้องกับความต้องการที่แท้จริง


๒. เมื่อสำนักบัญชีและการคลังแจ้งจัดสรรวงเงินงบประมาณเพื่อดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ขอให้จัดทำรายงานแผนปฏิบัติการการจัดซื้อจัดจ้าง ส่งให้กลุ่มตรวจสอบภายในตามบันทึกข้อความที่ ตผ ๐๐๖๖/๒๕๑ ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และหากได้รับจัดสรรวงเงินงบประมาณเพิ่มเติมระหว่างปีขอให้ดำเนินการตามบันทึกข้อความฯ ดังกล่าวด้วย

๓. การขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี ควรมีความพร้อมของแบบรูปรายการ พื้นที่ที่จะดำเนินการ และควรระบุคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ให้ชัดเจน เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และให้ถือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐ เรื่อง การพิจารณาและตรวจสอบความพร้อมในการดำเนินการตามแผนงาน/โครงการของส่วนราชการและการตรวจสอบข้อมูลผู้ละทิ้งงานราชการ และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เรื่องการตรวจสอบและจัดเตรียมความพร้อมในการดำเนินการตามแผนงาน/โครงการของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ อย่างเคร่งครัด


๔. เมื่อได้รับจัดสรรงบประมาณรายการค่าครุภัณฑ์แล้วควรดำเนินการทันที เพื่อลดปัญหากรณีราคาตลาดที่เปลี่ยนแปลงไปทำให้วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรไม่เพียงพอ ทั้งนี้ ในการตั้งวงเงินงบประมาณจัดซื้อจัดจ้าง ควรพิจารณาราคาครุภัณฑ์จากบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ

๕. การประกาศประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ควรกำชับให้ผู้รับผิดชอบมีความละเอียดรอบคอบในการตรวจสอบเอกสาร และแบบรูปรายการที่ใช้ประกอบการประกวดราคาก่อนที่จะนำไปประกาศเผยแพร่ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามแผนปฏิบัติการการจัดซื้อจัดจ้างที่กำหนดไว้


ภาพที่ ๑ แผนภูมิวงปริมาณในการจัดซื้อจัดจ้าง (ค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

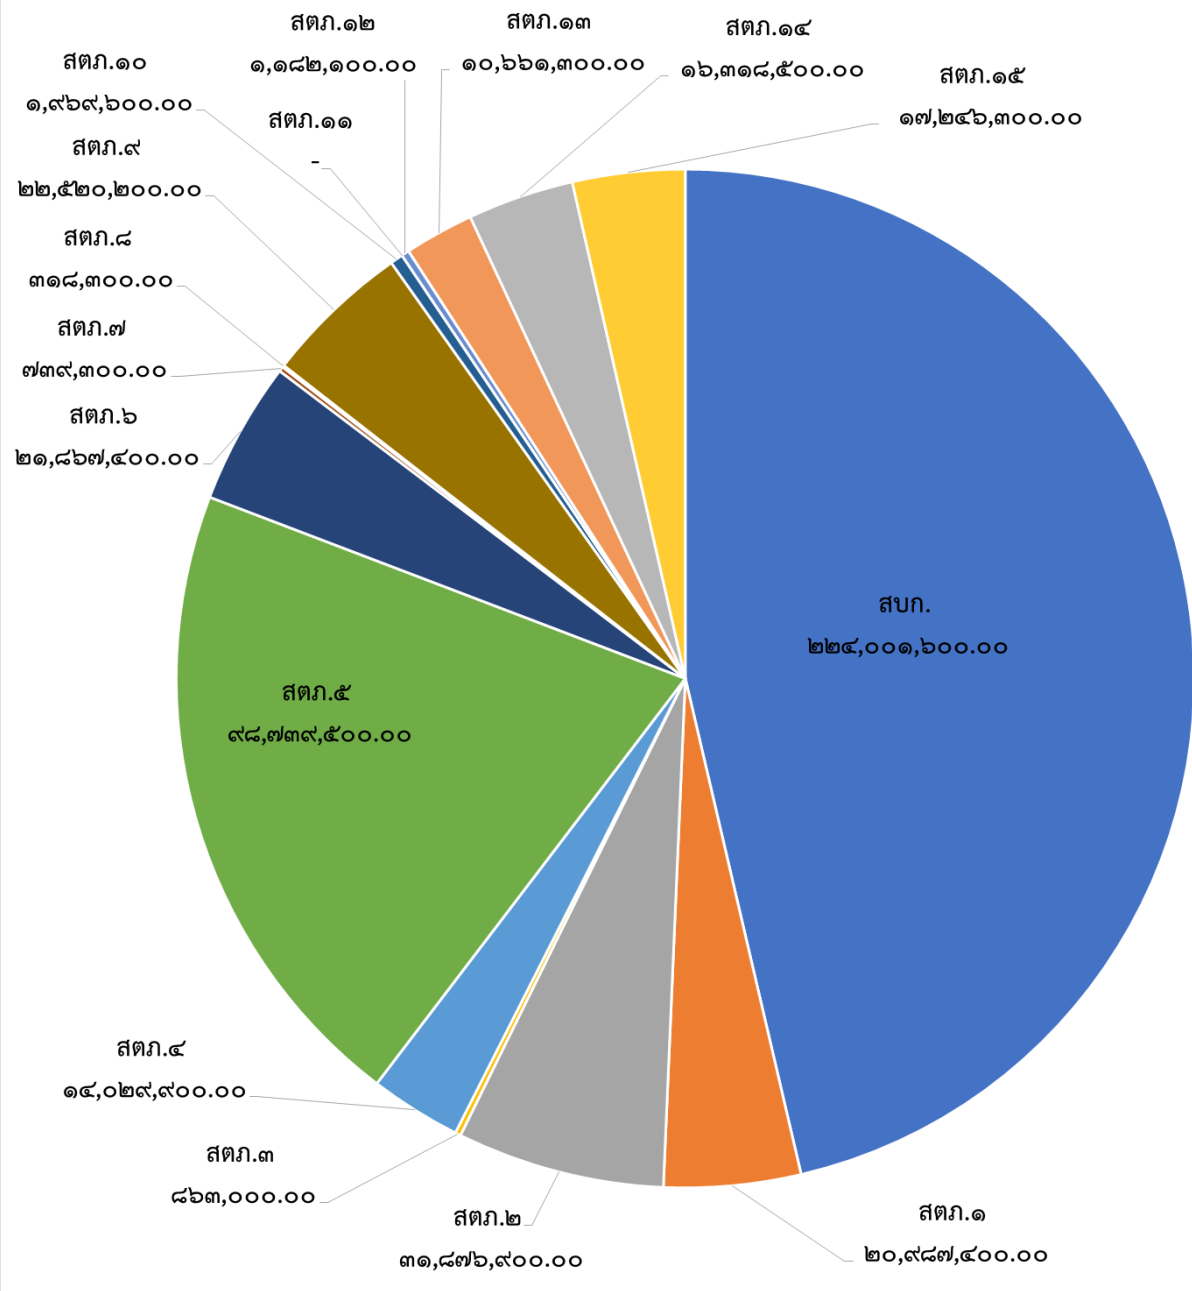


ภาพที่ ๒ แผนภูมิสรุปรายงานการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างในภาพรวม (ค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

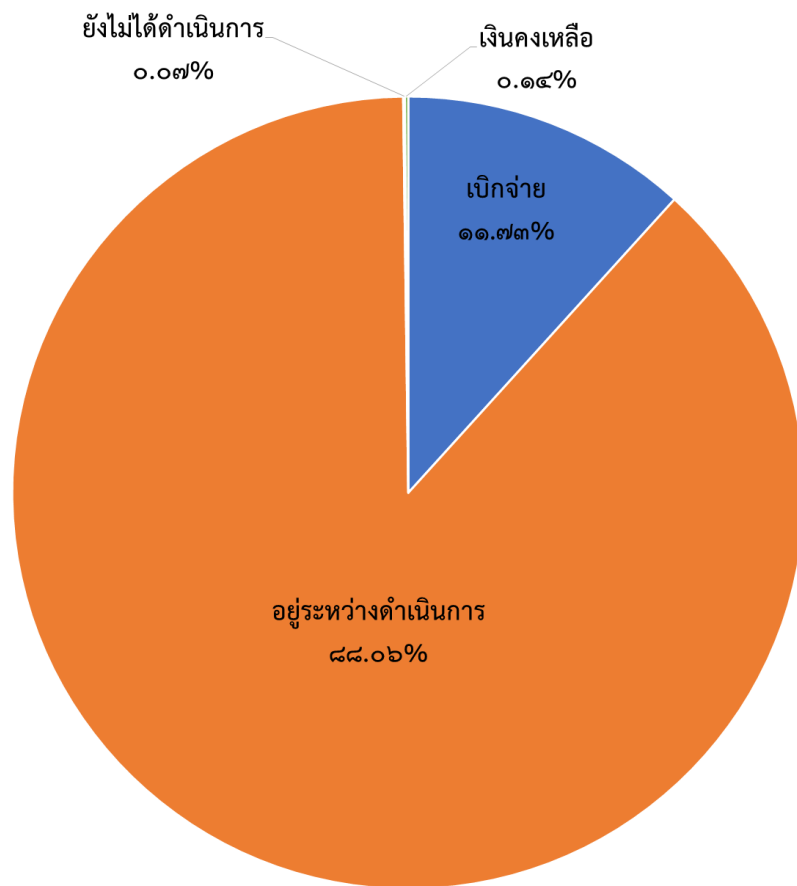

ภาพที่ ๓ แผนภูมิแสดงร้อยละของจำนวนรายการหรือโครงการที่จัดซื้อจัดจ้าง (ค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง)
จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

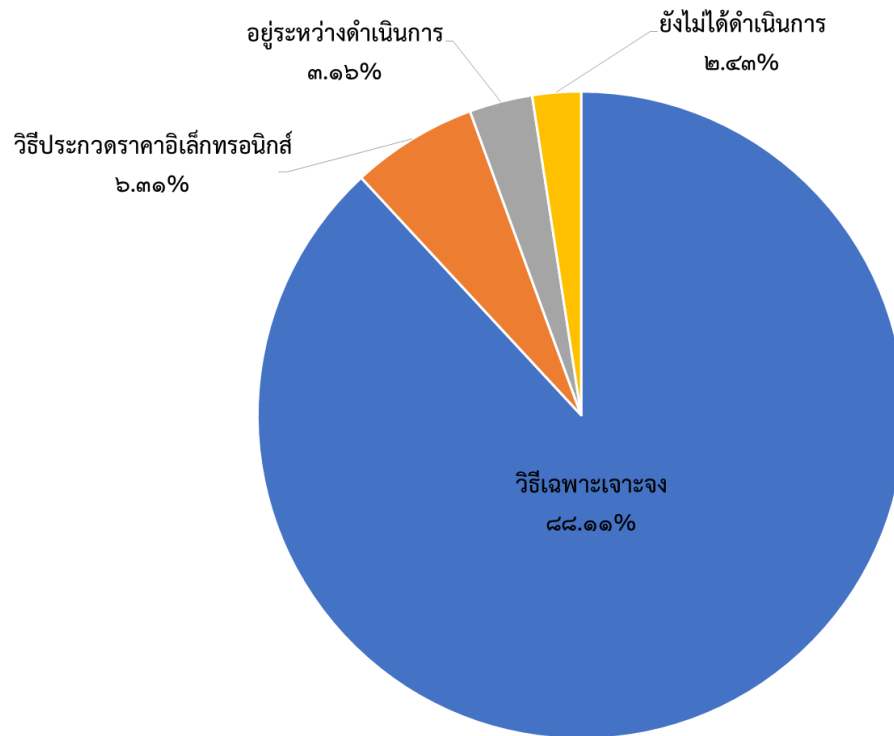

ภาพที่ ๔ แผนภูมิแสดงร้อยละของจำนวนงบประมาณที่จัดซื้อจัดจ้าง (ค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง)
จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

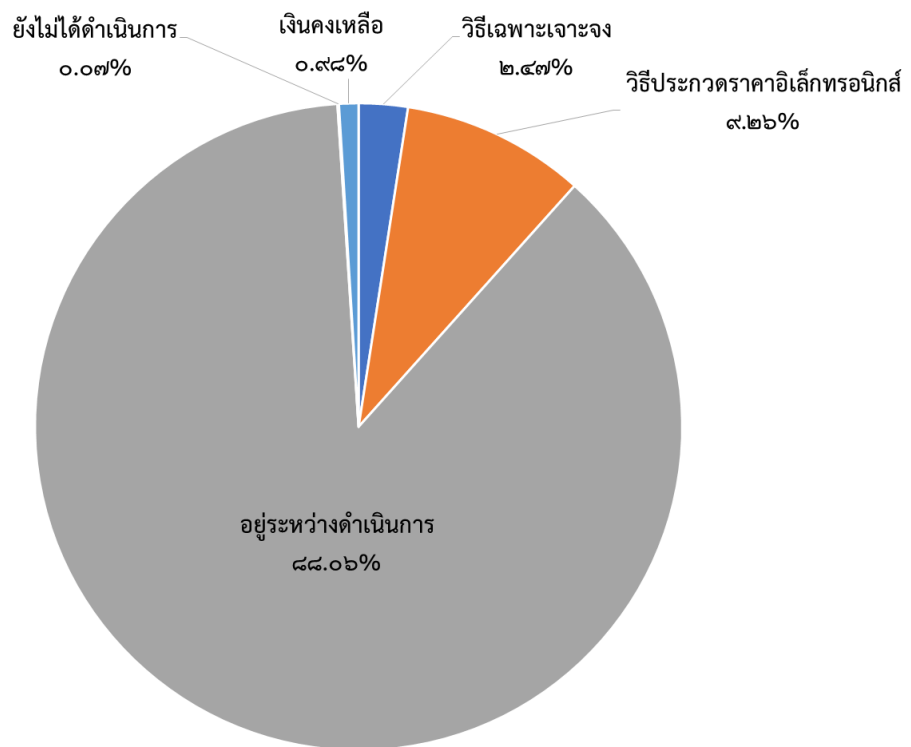

หมายเหตุ งบประมาณที่อยู่ระหว่างดำเนินการร้อยละ ๘๘.๐๖ ส่วนใหญ่เป็นงบประมาณของโครงการ ดังนี้

๑. งานก่อสร้างช่องทางหนีไฟและบันไดหนีไฟบริเวณด้านหลังห้องประชุมดำรงอิศรานุวรรต
๒. โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (แห่งใหม่)
๓. การจ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (แห่งใหม่)
๔. งานก่อสร้างอาคารศูนย์จัดเก็บและควบคุมเอกสาร
๕. ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและบริการแบบบูรณาการ
๖. โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการและอาคารชุดพักอาศัย สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครนายก
๗. โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการและอาคารชุดพักอาศัย สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสระแก้ว
๘. โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการและอาคารชุดพักอาศัย สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดระนอง
๙. โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการและอาคารชุดพักอาศัย สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพัทลุง
๑๐. โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการและอาคารชุดพักอาศัย สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสตูล
๑๑. โครงการก่อสร้างอาคารสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ
๑๒. โครงการก่อสร้างอาคารสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครพนม พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ
๑๓. โครงการก่อสร้างอาคารสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพะเยา พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ
